

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ANATEL

RELATÓRIO TÉCNICO DE AUDITORIA

Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia

DADOS DA PRESTADORA E CONTRATO

Prestadora: WLAN SISTEMAS

Plano: PACOTE R/C SUMMER 500MB+EXITLAG

Velocidade Contratada: 500 Mbps (download) / 250 Mbps (upload)

Período de Análise: 15/02/2026 13:52:45 até 15/02/2026 13:53:24

Total de Medições: 29 (ping) | 2 (velocidade)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Resolução nº 574/2011 da ANATEL
- RQUAL - Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações
- Resolução nº 777/2025 - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor
- Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor

Gerado em: 15/02/2026 às 13:53:24 | Conforme metodologia ANATEL Qualidade

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO

1. BASE LEGAL

Conforme a Resolução nº 574/2011 da ANATEL e o RQUAL, as prestadoras devem garantir:

- Velocidade MÉDIA mensal: mínimo de 80% do contratado
- Velocidade INSTANTÂNEA: mínimo de 40% em cada medição

2. PROCEDIMENTO DE TESTE

Para que a aferição seja válida conforme regulamentação:

- Equipamento conectado via cabo de rede (LAN)
- Conexão direta na porta LAN da ONU/Roteador
- Testes via Wi-Fi NÃO são considerados válidos

3. PARÂMETROS DE ANÁLISE

Velocidade Contratada: 500 Mbps (↓) / 250 Mbps (↑)

Mínimo 80%: 400 Mbps (↓) / 200 Mbps (↑)

Mínimo 40%: 200 Mbps (↓) / 100 Mbps (↑)

4. PONTOS DE TESTE

Gateway Local: 192.168.18.1


Servidor Externo: ec2.sa-east-1.amazonaws.com

Limite de Latência: 100 ms

REGISTRO DE MEDIÇÕES DE PING - Página 1/1

#	Timestamp	Gateway	Externo	Status
1	2026-02-15 13:52:45	2.0ms	60.0ms	OK
2	2026-02-15 13:52:46	2.0ms	61.0ms	OK
3	2026-02-15 13:52:47	3.0ms	61.0ms	OK
4	2026-02-15 13:52:48	2.0ms	61.0ms	OK
5	2026-02-15 13:52:49	63.0ms	128.0ms	ALTO
6	2026-02-15 13:52:51	70.0ms	87.0ms	OK
7	2026-02-15 13:52:52	53.0ms	79.0ms	OK
8	2026-02-15 13:52:53	13.0ms	193.0ms	ALTO
9	2026-02-15 13:52:54	57.0ms	260.0ms	ALTO
10	2026-02-15 13:52:56	104.0ms	147.0ms	ALTO
11	2026-02-15 13:52:57	39.0ms	113.0ms	ALTO
12	2026-02-15 13:52:58	3.0ms	76.0ms	OK
13	2026-02-15 13:53:00	16.0ms	163.0ms	ALTO
14	2026-02-15 13:53:01	41.0ms	88.0ms	OK
15	2026-02-15 13:53:02	15.0ms	122.0ms	ALTO
16	2026-02-15 13:53:03	23.0ms	63.0ms	OK
17	2026-02-15 13:53:04	63.0ms	76.0ms	OK
18	2026-02-15 13:53:06	11.0ms	68.0ms	OK
19	2026-02-15 13:53:07	9.0ms	71.0ms	OK
20	2026-02-15 13:53:08	5.0ms	91.0ms	OK
21	2026-02-15 13:53:09	2.0ms	62.0ms	OK
22	2026-02-15 13:53:10	2.0ms	62.0ms	OK
23	2026-02-15 13:53:11	2.0ms	62.0ms	OK
24	2026-02-15 13:53:12	2.0ms	62.0ms	OK
25	2026-02-15 13:53:14	3.0ms	63.0ms	OK
26	2026-02-15 13:53:15	15.0ms	72.0ms	OK
27	2026-02-15 13:53:16	54.0ms	171.0ms	ALTO
28	2026-02-15 13:53:17	2.0ms	103.0ms	ALTO
29	2026-02-15 13:53:19	70.0ms	62.0ms	OK


Gráfico de Latência (Ping)
2026-02-15 13:52:45 → 13:53:19

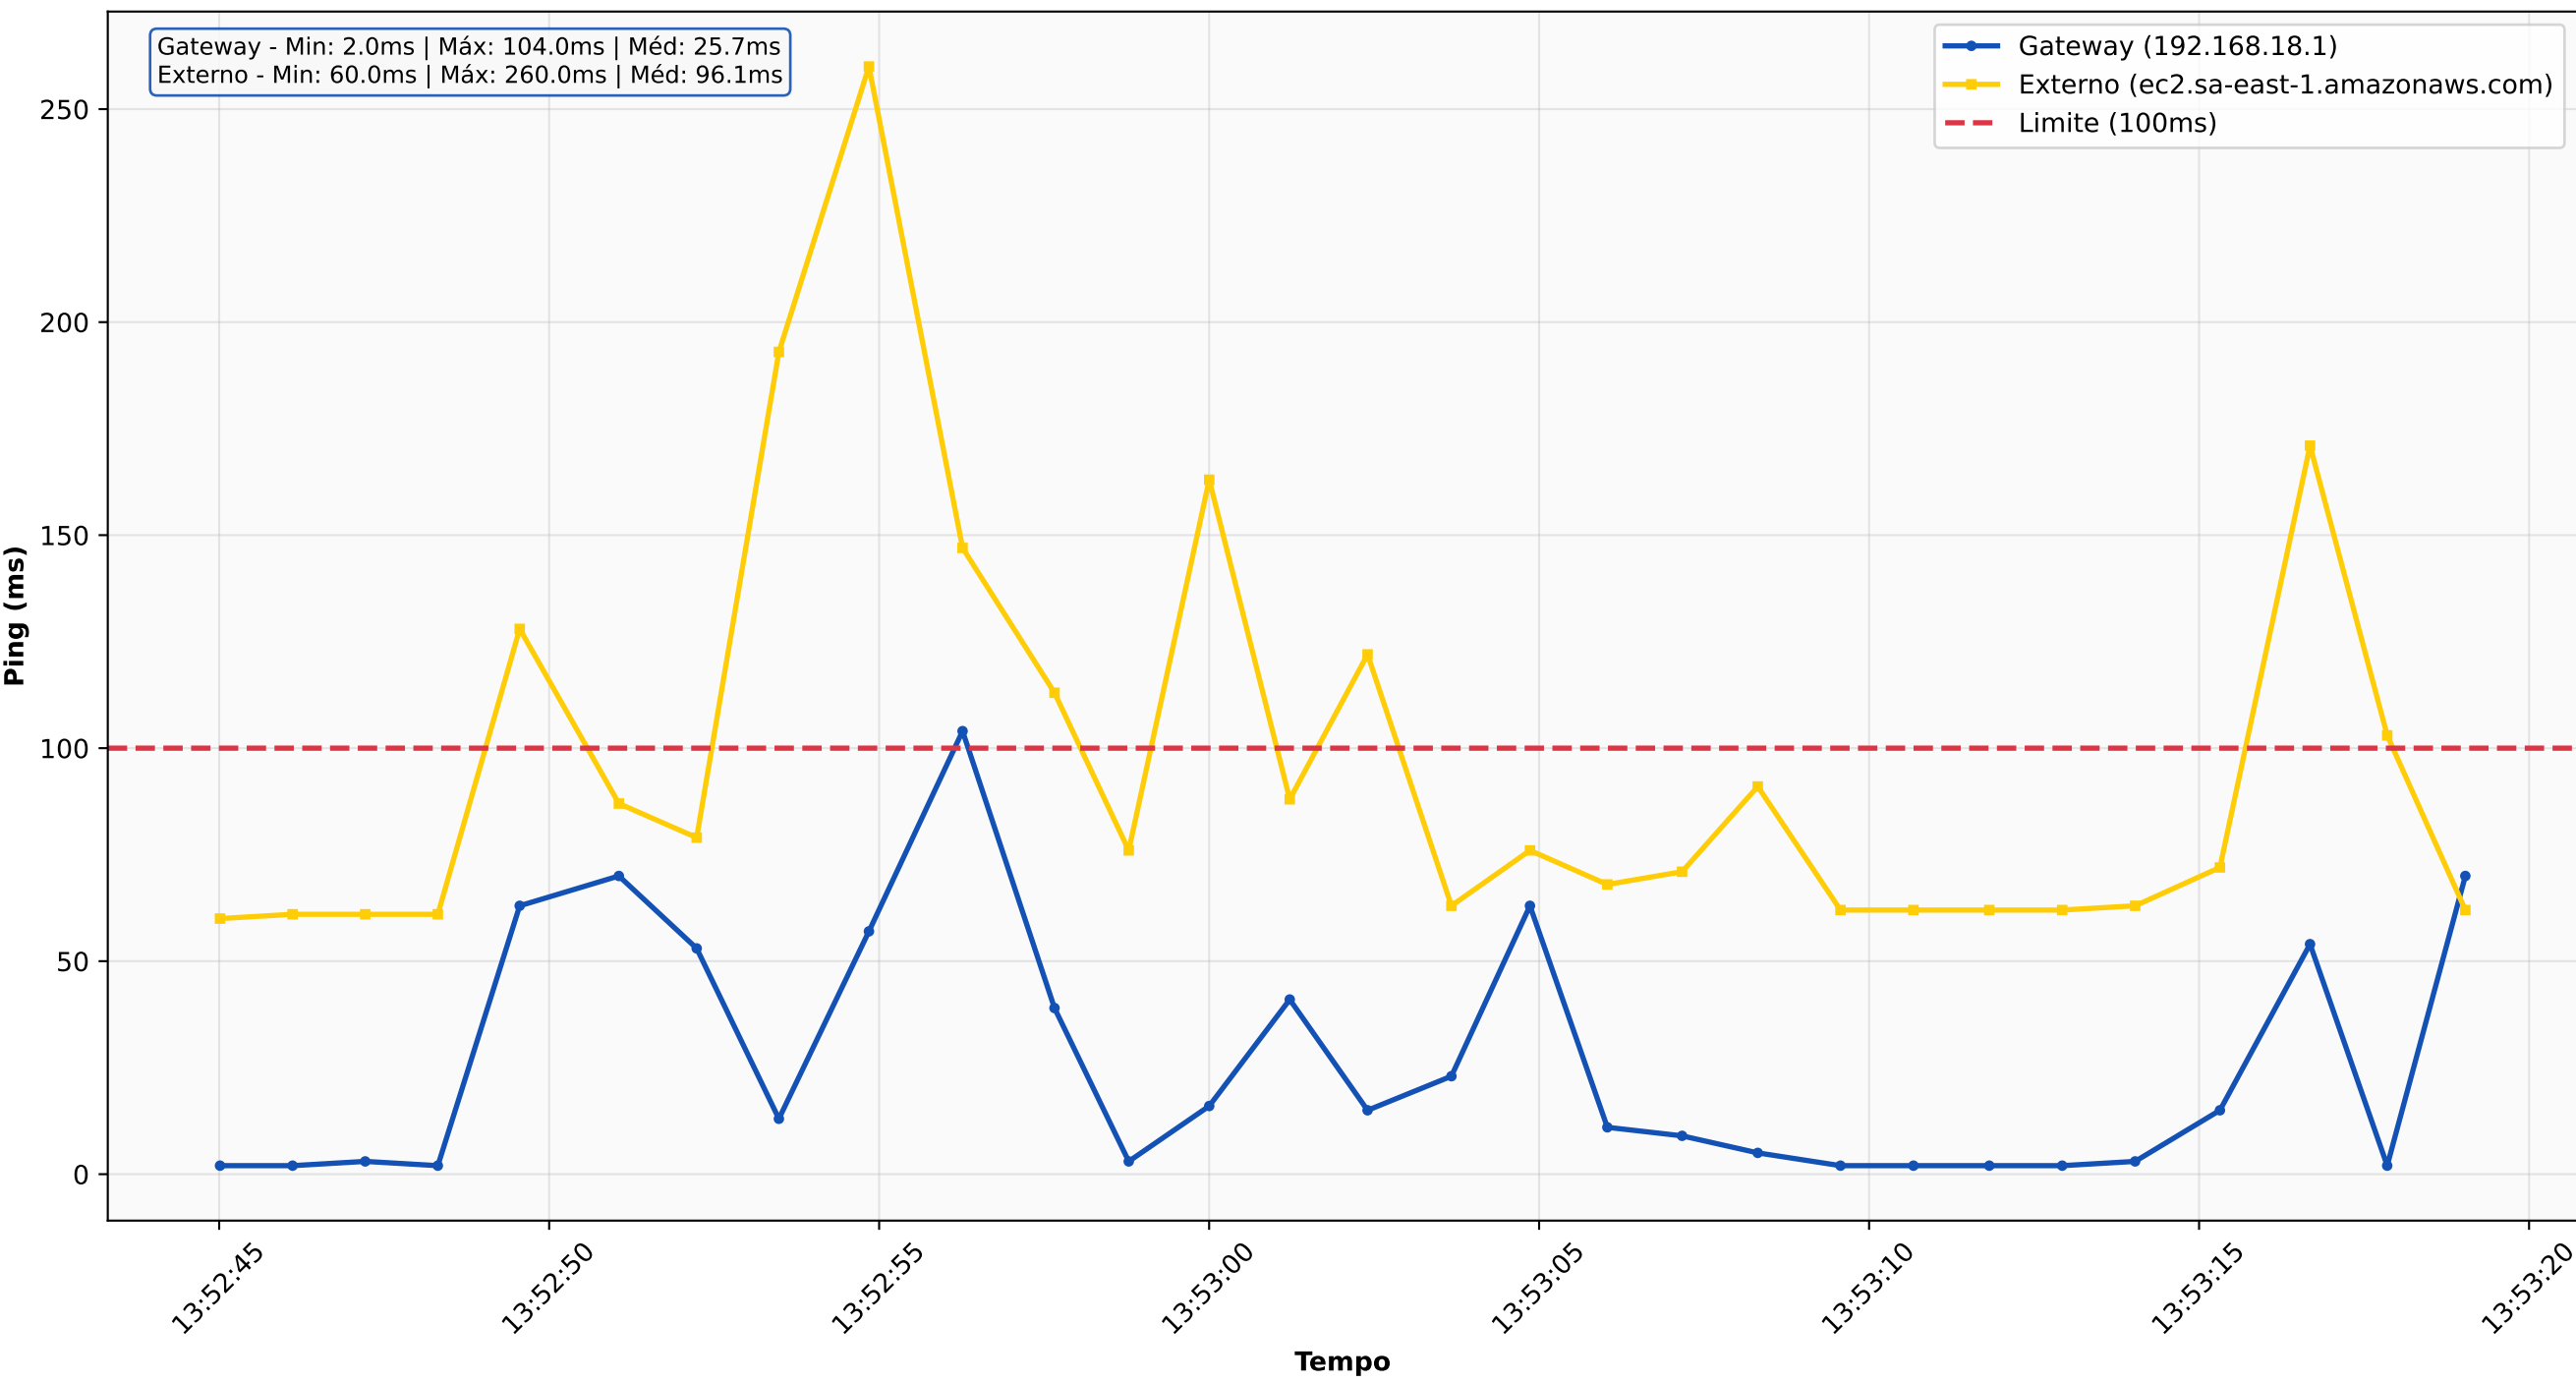

REGISTRO DE TESTES DE VELOCIDADE - 2 testes

#	Horário	Provedor	Download	Upload	%Vel	Status
1	13:53:08	Speedtest.n...	153Mbps	62Mbps	28%	VIOLAÇÃO
2	13:53:19	Fast.com	143Mbps	57Mbps	26%	VIOLAÇÃO

Gráfico de Velocidade - 2 testes
Download: Média 147.8 Mbps (Min: 142.6, Max: 153.0)
Upload: Média 59.4 Mbps (Min: 57.0, Max: 61.9)

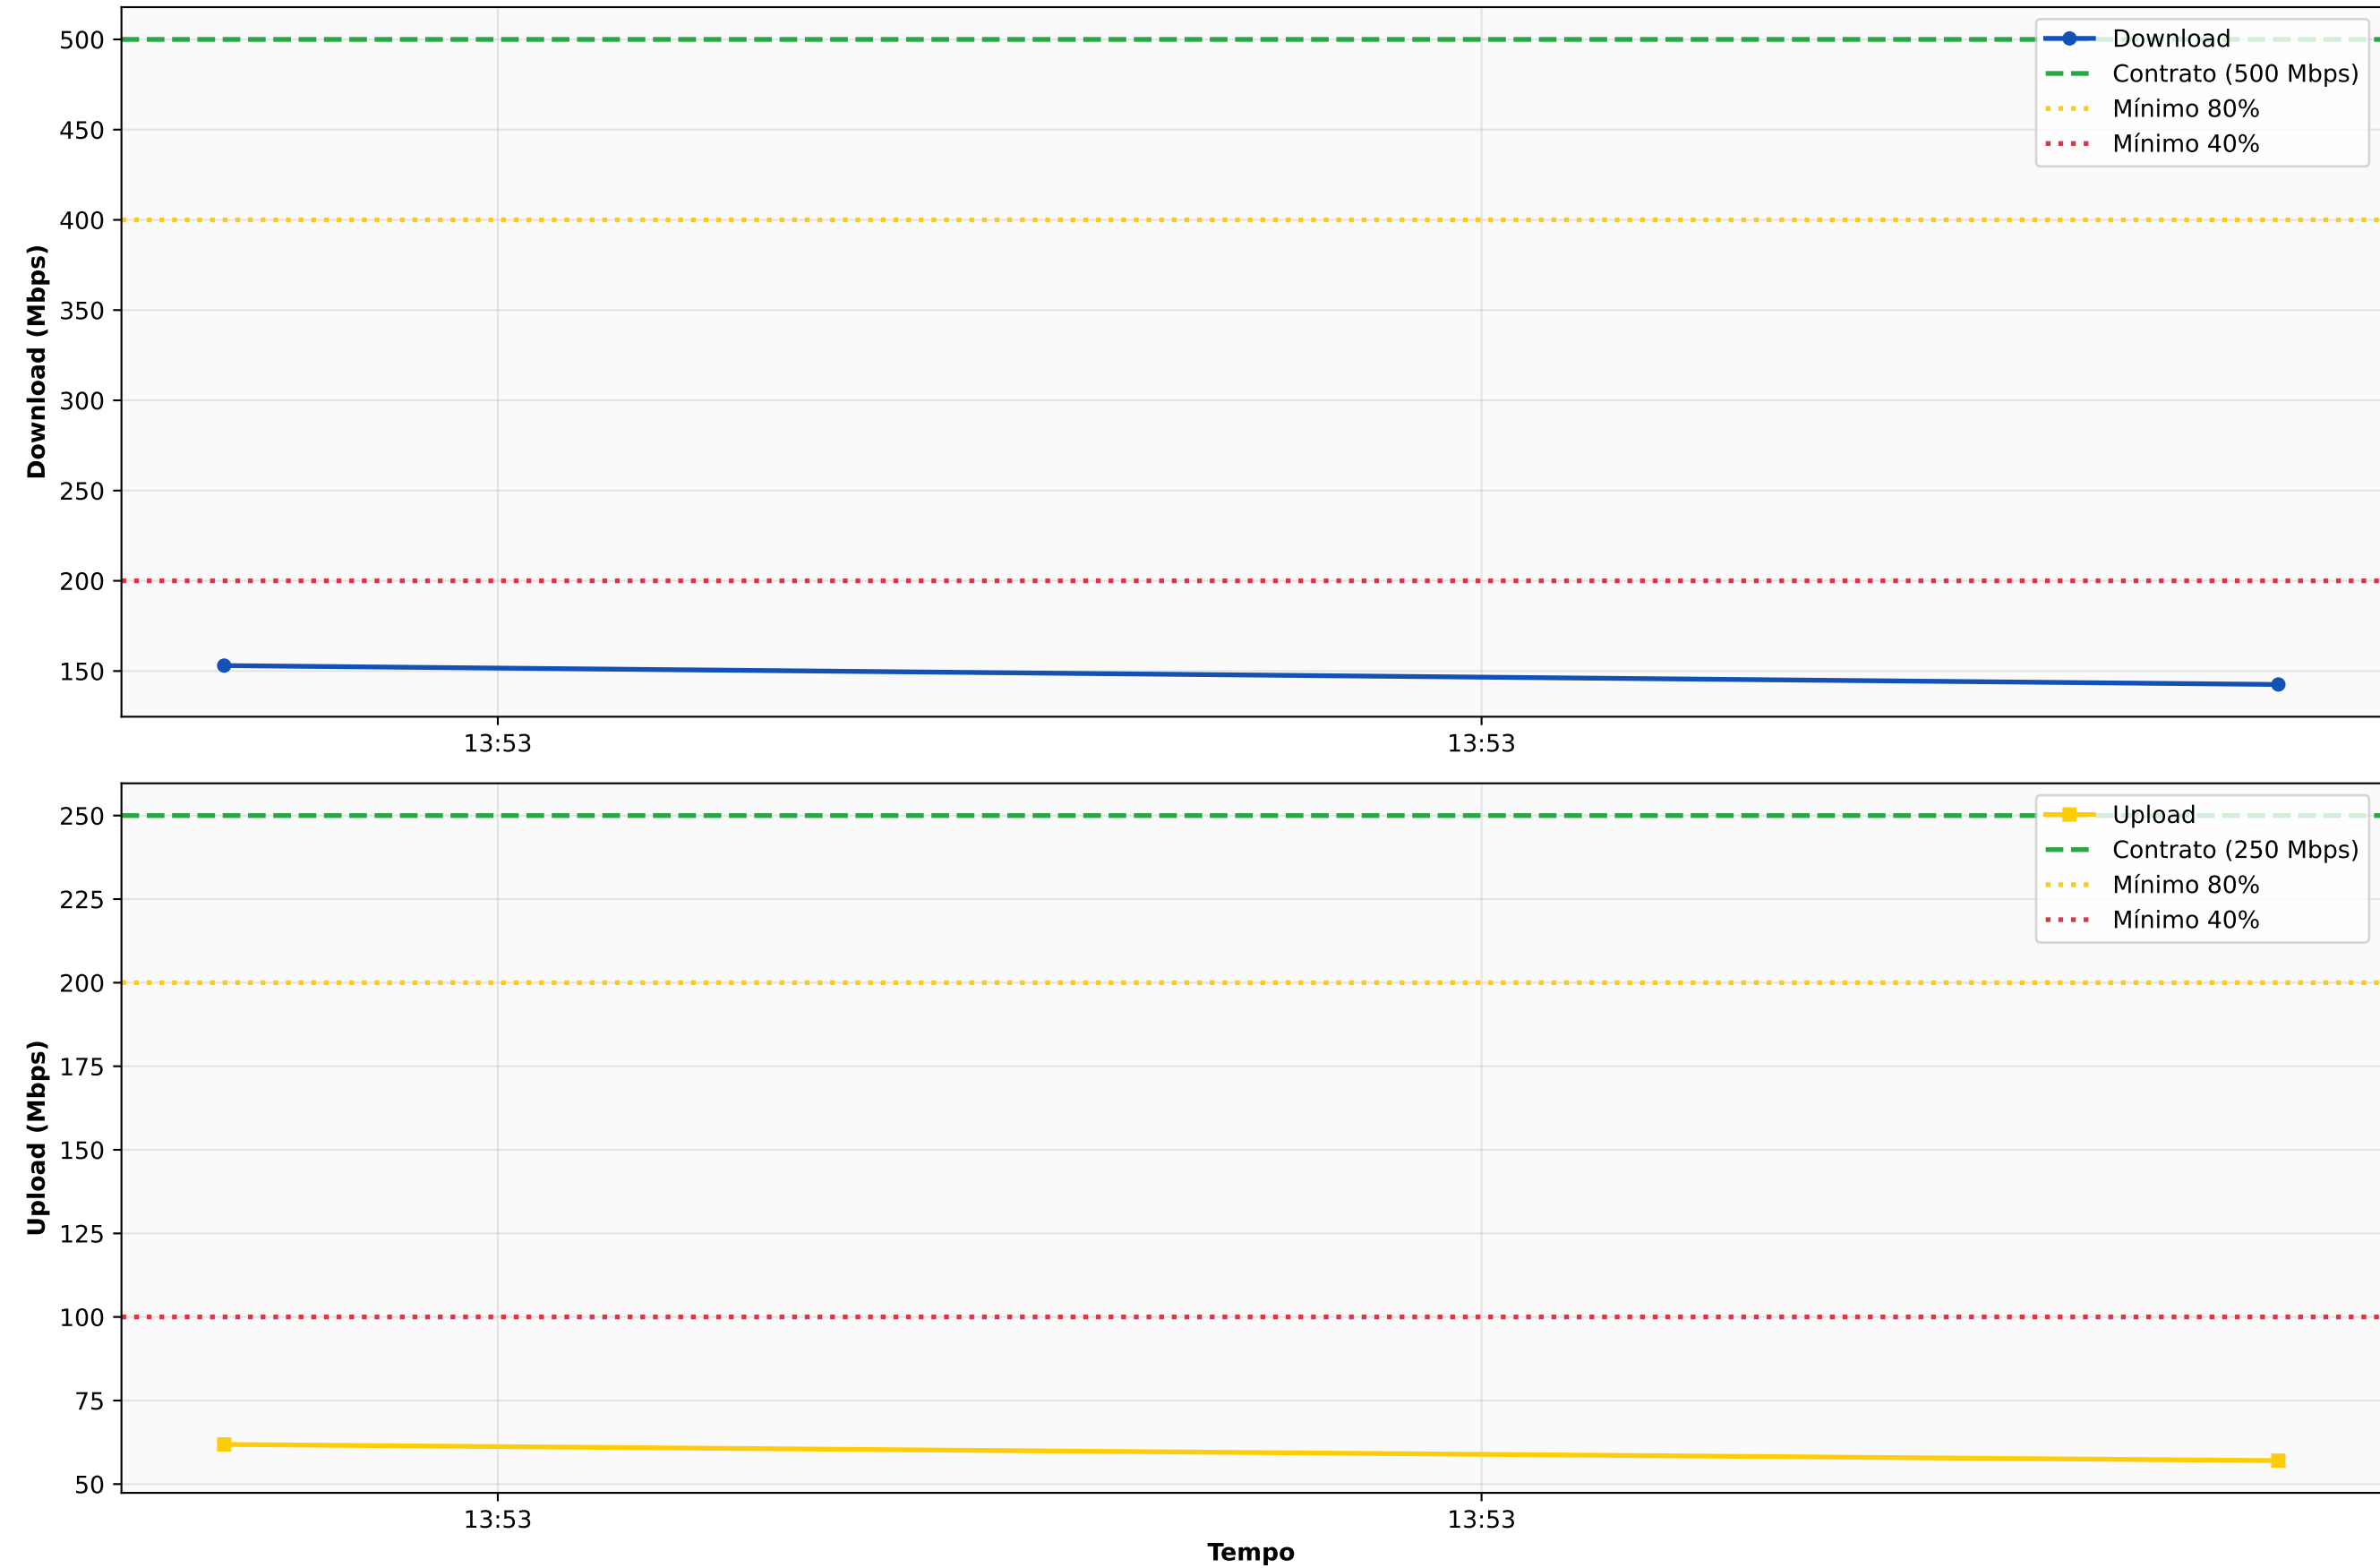

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO

1. ESTATÍSTICAS DE LATENCIA (PING)

Total de Medições: 29

Timeouts: 0 (0.0%)

Alta Latência (>100ms): 9

Gateway (192.168.18.1): Min 2.0ms / Max 104.0ms / Med 25.7ms

Externo (ec2.sa-east-1.amazonaws.com): Min 60.0ms / Max 260.0ms / Med 96.1ms

2. ESTATÍSTICAS DE VELOCIDADE

Total de Testes: 2

Download: Média 147.8 Mbps (29.6% do contratado) - NAO CONFORME

Upload: Média 59.4 Mbps (23.8% do contratado) - NAO CONFORME

3. CONCLUSÃO FINAL

SERVIÇO NÃO CONFORME

A velocidade média está ABAIXO dos parâmetros ANATEL (mín 80%).

TERMO DE VERIFICAÇÃO

Declaro que presenciei a realização dos testes de velocidade e latência descritos neste relatório, realizados conforme procedimento ANATEL.

CLIENTE / CONTRATANTE

Nome:

CPF/CNPJ:

Data:

Assinatura: _____

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome:

CPF:

Registro/Matrícula:

Data:

Assinatura: _____

OBSERVAÇÕES
